



リノベーションレター



★第3号★令和7年4月

発行：北区教育委員会事務局
教育振興部学校改築施設管理課



豊川小学校



北区では、令和9年3月整備完了を目指し、豊川小学校リノベーション事業を進めています。リノベーションレター第3号では、完成した仮設校舎や代替運動スペースなどについてご紹介します。

1. 仮設校舎が完成しました。

昨年の夏に工事を開始した仮設校舎が完成しました。プレハブ造軽量鉄骨の3階建てです。内外の様子を一部ご紹介します。

普通教室等



外観



特別教室等



音楽室が入る教室は二重扉・防音壁にしています。

給食運搬に...




給食を各階へ運搬する小荷物昇降機です。

だれでもトイレ



階段、廊下など

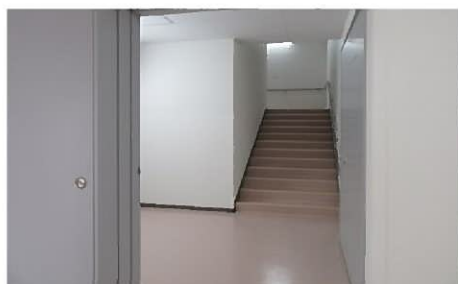

防火扉・手すりなども設置



広くゆとりのある廊下



1階南側教室から直接外へ出られます。

2. 1ブロック工事期間中の仮設校舎の部屋配置

令和7年4月からのリノベーション工事に伴い、1ブロック工事の区域に該当する諸室を仮設校舎に移転しました。主な工事範囲と仮設校舎の部屋配置は次のとおりです。1ブロック工事の期間は年内を予定しております。

主な工事範囲

★ 校舎西側

図書室
メディアセンター
図工室
図工準備室
パソコン室
学童
放課後子ども

★ 校舎東側



普通教室
特別支援教室

★ 別棟（学童棟）

★ 体育館

★ プール《夏休み以降》

仮設校舎の部屋配置（1ブロック）

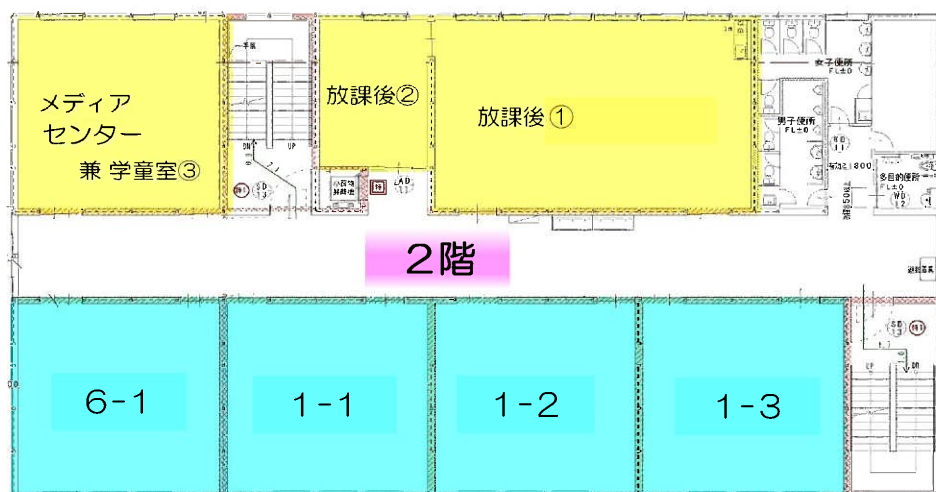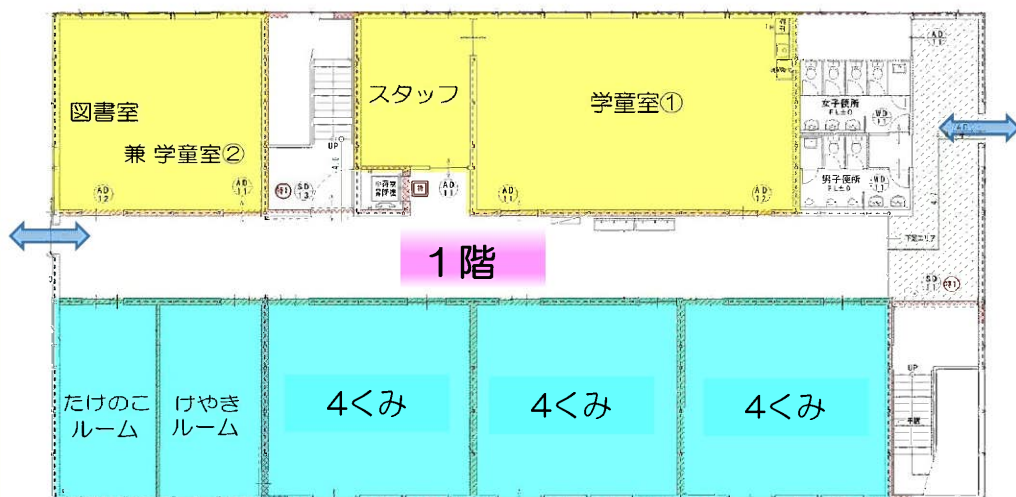

3. 代替運動スペースについて

昨年夏から校舎屋上と旧清至中学校体育館の改修工事を行い、児童の運動スペースとして使えるようになりました。工事中は校庭が狭くなったり、体育館が使えない時期もありますが、これらを活用し運動できるようにしていきます。また運動会などのイベントは、隣接する明桜中学校を使用する予定です。

校舎屋上



50m走も余裕でできる広さです。

旧清至中体育館



中学校のため広く、アリーナの床も新品同様になりました。



旧清至中校庭は、現在清掃車等の車庫となっていますが、動線を完全に分けることで安全を確保いたします。



児童：通用門を使用し
バリケードの奥を通ります。

清掃車：正門を使用し
バリケードの手前を通ります。

豊川小学校リノベーション事業完了後のイメージ



4. いよいよリノベーション工事が始まりました。

令和9年3月の整備完了に向け、4月8日の工事説明会を踏まえリノベーション工事が始まりました。まずは工事ヤード（工事業者が利用する現場事務所、工事の資材や工事車両等の置場）と利用者空間を仕切り、慎重かつ安全に工事を進めて参ります。


1 スケジュール

		令和6年度	令和7年度	令和8年度
先行工事	屋上床改修工事	7月末～11月完了 [黄色矢印]		
	旧清至中体育館改修工事	8月末～1月完了 [黄色矢印]		
	仮設校舎設置工事	7月末～2月完了 [黄色矢印] 建設		9月～11月予定 [黄色矢印] 解体
リノベーション工事	1期工事		4月着工 [青色矢印]	
	2期工事			3月末完了予定 [青色矢印]

※体育館の工事は1期工事で行います。

※プール改修工事は、7年秋頃の着手を予定しています。

 2 工事仮設計画（予定）

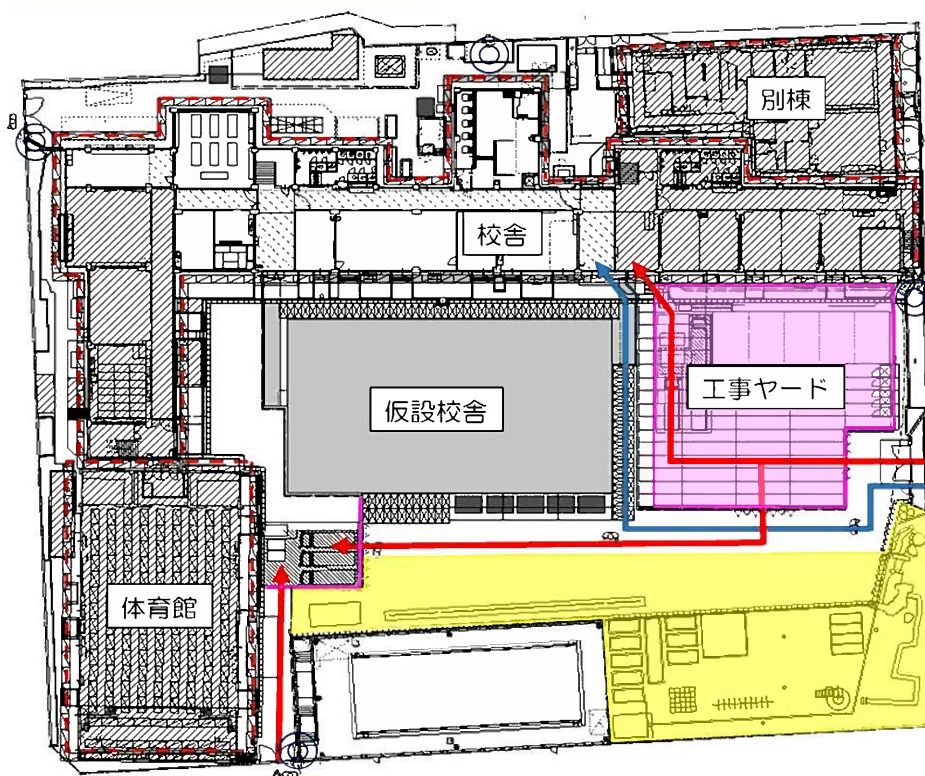

交通誘導員は、学校
運営状況と工事の作
業状況にあわせて、
適切に配置します。

仮設足場

仮用い

◎ 聲音振動計

工事動線

利用者動線

敷地南側のスペースは、基本的に運動スペースなど、学校運営スペースとして使用できます。

工事動線と学校運営スペースは、児童の安全確保をするため、状況に応じて区画します。

安全を
最優先で
工事を進めて
まいります。



お問い合わせ先

「事業に関すること」

北区教育委員会事務局 教育振興部
学校改築施設管理課 担当：林・鈴木
電話：03-3908-9277
FAX：03-3910-6885

「工事に関すること」

北区総務部営繕課 教育施設担当
担当：吉田
電話：03-3908-8123
FAX：03-3908-8049
